

西園醫院 × CTK PRO 竝盛科技

官網升級 PHP 8.4 評估與工作規劃

為什麼要升級・有哪些地方要先處理
分階段上線的做法、工時，以及需要貴院確認的事

升級原因

評估結果


工作規劃

工時估算

待確認事項

PHP 8.4

PHP 7.4 已經停止安全更新近四年

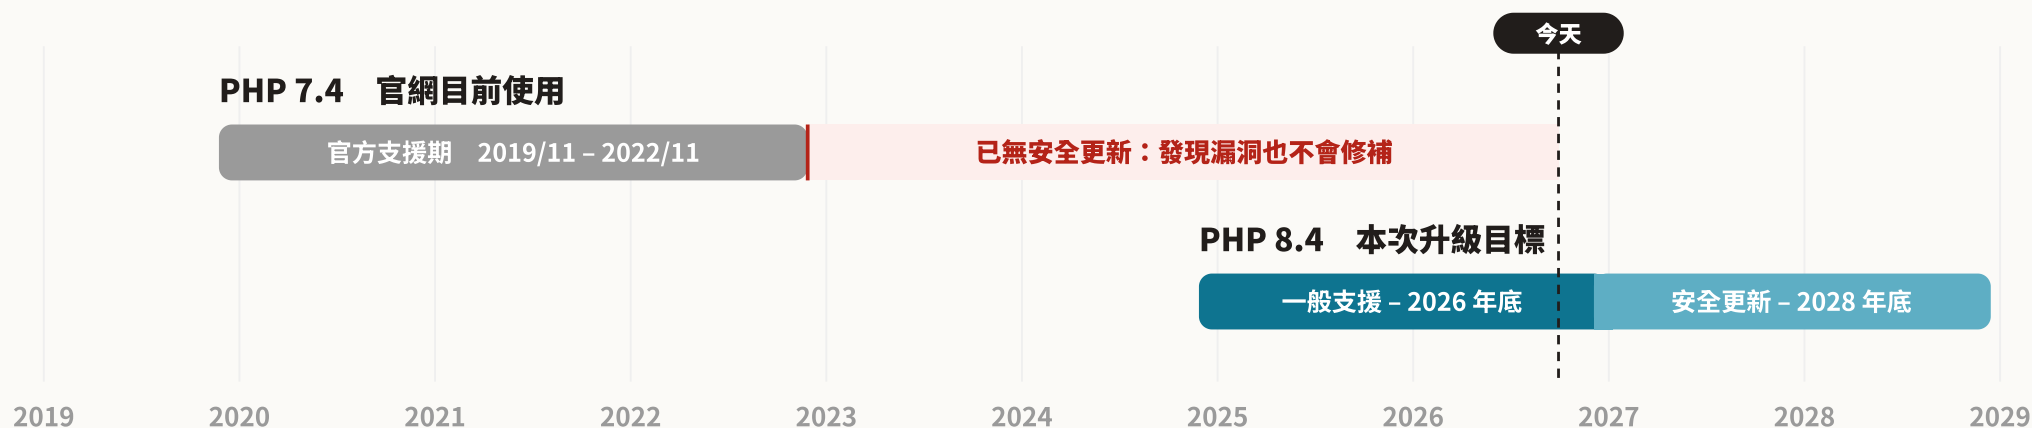

漏洞不再修補

PHP 7.4 之後發現的安全問題，官方都不會再出修補。

外掛更新跟不上

新版外掛陸續要求較新的 PHP。外掛無法更新，外掛的漏洞也就無法修補。

升到 8.4 一次到位

8.4 的安全更新到 2028 年底，升級後兩年多不必再處理執行環境。

可以升級，有三個地方要先處理

我們以自動掃描檢查了主題、子主題與 40 套啟用中的外掛，再用新版 PHP 做語法檢查，並逐項人工確認。

不修會出錯

1 首頁輪播

主題的輪播程式有一行寫法，在 PHP 8 會直接中斷，**首頁整頁無法顯示**。

修正只要改一行，同時把主題其他功能也實測一遍。

▸ 主題 MediCenter

需換新版

2 表單收件匯出

目前版本附帶的 Excel 匯出元件，**無法在 PHP 8 執行**。

改用官方新版：**收件資料沿用原資料表、不需搬移**，匯出仍是 Excel。

▸ 外掛 Advanced CF7 DB

需升級，工作量最大

3 頁面編輯器

目前是 2020 年的 6.4.1 版，需要升級到新版。

主題對它做了大量客製，**升級後要逐頁檢查版面**（下一頁說明）。

▸ 外掛 WPBakery Page Builder

其餘外掛：掃描到的舊寫法都有版本判斷保護，實際不會執行，更新到最新版即可。已停用的舊輪播外掛 Slider Revolution 會一併移除。

頁面編輯器升級後，版面要逐頁對齊

主題對 WPBakery 的客製程度

14

支版面模板被主題改寫

欄、列、頁籤、手風琴、按鈕等

33

個主題自訂的編輯器元件

科別、醫師、門診表、輪播、文章列表等

6

種自訂的設定欄位

元件設定視窗裡的下拉、多選、清單等

升級後我們會做的事

- **移植版面模板** 把 14 支改寫過的模板對照新版結構重新整合
- **檢查編輯器元件** 確認後台每個元件的設定視窗都能開啟、存檔
- **前台逐頁比對** 升級前後逐頁比對畫面，修正跑掉的版面

預估 16-28 小時

區間取決於用 WPBakery 排版的頁面有多少。開工前我們會先統計頁面與元件用量，把估算收斂。

▶ WPBakery 需購買新授權（費用見最後一頁）

分六個階段，每段上線後網站都正常



STEP 0-3 都在**現行主機（PHP 7.4）**上完成並分批上線，每一批上線後網站都正常運作；最後才把網站切換到**貴院新主機（PHP 8.4）**，舊主機保留到穩定為止，**有狀況可立即切回**。

合計 44–71 小時，約 6–9 個工作天

階段	工作項目	內容	工時（小時）
0. 準備	環境準備	同步正式站到測試環境、全站備份，WordPress 核心升到最新版	2–3
1. 主題修正	MediCenter 主題	修首頁輪播；科別、醫師、門診表、小工具、主題設定實測修正；子主題網路掛號流程與 App 資料介面實測修正；清理棄用警告	12–20
2. 外掛更新	一般外掛	約 35 套外掛更新到最新版，並確認設定	2–3
3. 外掛替換與升級	表單收件外掛	切換 Advanced CF7 DB 新版，測試匯出、匯入與前台顯示	3–5
	頁面編輯器	WPBakery 升級；移植 14 支版面模板、檢查 33 個自訂元件、前台逐頁修版面	16–28
	移除舊外掛	移除已停用的 Slider Revolution 與舊版備份檔	0.5–1
4. 新主機測試	整站回歸測試	部署到新主機（PHP 8.4），測試網路掛號、表單收件與匯出、病床差額、門診表等功能，以及整站頁面	6–8
5. 正式上線	切換與觀察	備份、切換到新主機、上線後監控；舊主機保留作為退回方案	2–3
合計（約 6–9 個工作天）			44–71

不含：主題改版或重新設計（另估 24–40 小時）、新主機的作業系統與軟體安裝、貴院驗收時間、外掛授權費用。

需要貴院確認的三件事

1 新主機環境

請貴院準備一台新的 VM，安裝：

- **Ubuntu 24.04 LTS** 或 26.04 LTS
- **PHP 8.4** 含 curl、gd、mbstring、xml、zip、intl、mysqli
- **MySQL 8.4** 或 **MariaDB 11.4**
- 新主機需能連到**院內掛號系統**；若有來源 IP 白名單，請加入新主機

2 測試協助

- **網路掛號**會串接院內系統，請協助安排測試方式或時段，避免產生真實掛號
- 請使用**表單匯出**的同仁，確認新版匯出檔案符合需求

3 時程安排

- 依貴院可配合的時間，排定**新主機交付與測試窗口**
- 確認**正式上線**（切換到新主機）的日期，建議在夜間等離峰時段
- 需要事先通知的單位

其他需付費的外掛 2026/10/5 官網公告價，未稅，皆為單一網站授權

WPBakery Page Builder

US\$82 一次性

必要 頁面編輯器

ACF PRO

US\$49 / 年

建議 自訂欄位，取得更新

Slider Revolution

US\$45 / 年

選購 目前停用，續用才需購買

首年合計

US\$131

含選購 US\$176

① 確認範圍、購買授權、準備新主機 → ② STEP 0-3 修正並分批上線 → ③ 新主機整站測試 → ④ 切換到新主機並觀察
