

西園醫院・永越健檢 × CTK PRO 竑盛科技

兩站官網升級 PHP 8.4 評估與工作規劃

西園醫院、永越健檢兩個官網：為什麼要升級、各有哪些地方要先處理
分階段上線的做法、工時與授權費用，以及需要貴院確認的事

升級原因

評估結果

工作規劃


工時估算

授權費用

待確認事項

PHP 8.4

PHP 7.4 已經停止安全更新近四年

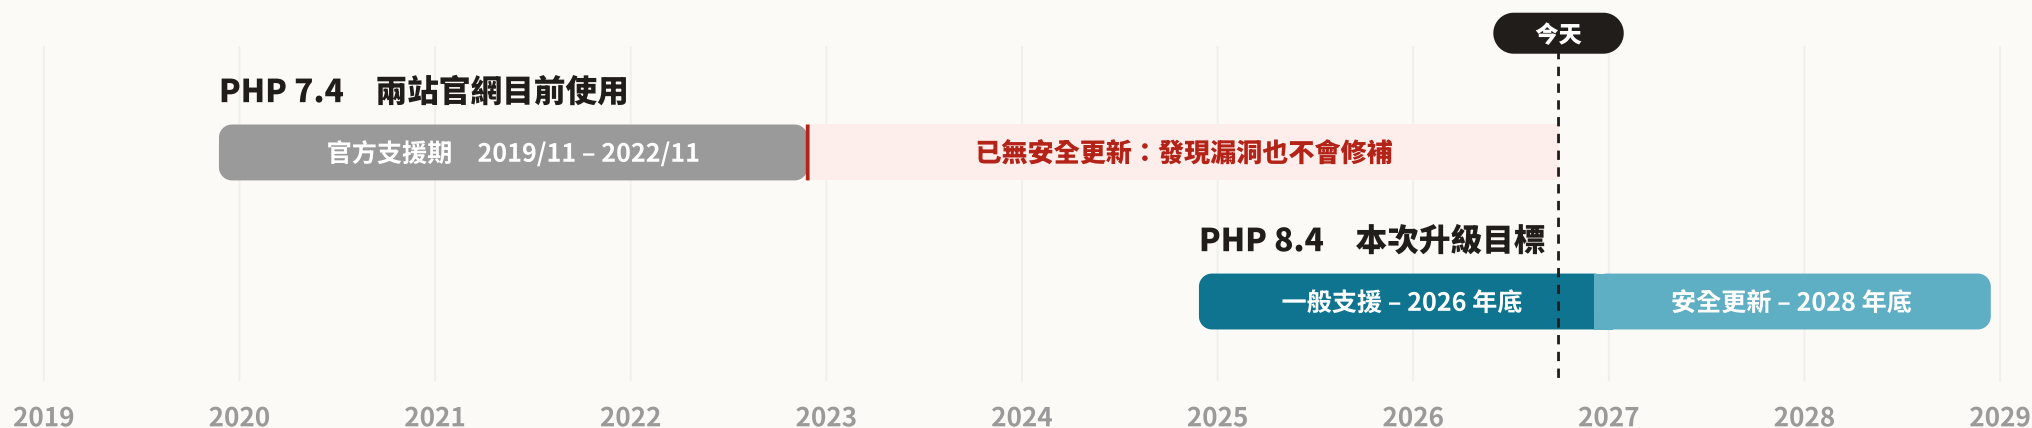

漏洞不再修補

PHP 7.4 之後發現的安全問題，官方都不會再出修補。

外掛更新跟不上

新版外掛陸續要求較新的 PHP。外掛無法更新，外掛的漏洞也就無法修補。

升到 8.4 一次到位

8.4 的安全更新到 2028 年底，升級後兩年多不必再處理執行環境。

西園可以升級，有三個地方要先處理

我們以自動掃描檢查了主題、子主題與 40 套啟用中的外掛，再用新版 PHP 做語法檢查，並逐項人工確認。

不修會出錯

1 首頁輪播

主題的輪播程式有一行寫法，在 PHP 8 會直接中斷，**首頁整頁無法顯示**。

修正只要改一行，同時把主題其他功能也實測一遍。

▶ 主題 MediCenter

需換新版

2 表單收件匯出

目前版本附帶的 Excel 匯出元件，**無法在 PHP 8 執行**。

改用官方新版：**收件資料沿用原資料表、不需搬移**，匯出仍是 Excel。

▶ 外掛 Advanced CF7 DB

需升級，工作量最大

3 頁面編輯器

目前是 2020 年的 6.4.1 版，需要升級到新版。

主題對它做了大量客製，**升級後要逐頁檢查版面**（下一頁說明）。

▶ 外掛 WPBakery Page Builder

其餘外掛：掃描到的舊寫法都有版本判斷保護，實際不會執行，更新到最新版即可。已停用的舊輪播外掛 Slider Revolution 會一併移除。

頁面編輯器升級後，版面要逐頁對齊

主題對 WPBakery 的客製程度

14

支版面模板被主題改寫

欄、列、頁籤、手風琴、按鈕等

33

個主題自訂的編輯器元件

科別、醫師、門診表、輪播、文章列表等

6

種自訂的設定欄位

元件設定視窗裡的下拉、多選、清單等

升級後我們會做的事

- **移植版面模板** 把 14 支改寫過的模板對照新版結構重新整合
- **檢查編輯器元件** 確認後台每個元件的設定視窗都能開啟、存檔
- **前台逐頁比對** 升級前後逐頁比對畫面，修正跑掉的版面

預估 16-28 小時

區間取決於用 WPBakery 排版的頁面有多少。開工前我們會先統計頁面與元件用量，把估算收斂。

▶ WPBakery 需購買新授權（費用見最後一頁）

永越也可以升級，有三個地方要先處理

同樣以自動掃描、新版 PHP 語法檢查與人工確認，檢查主題與約 39 套啟用中的外掛。

不修會出錯

1 主題 2 個致命問題

header.php 有**隱形空白字元**，會讓前台每一頁被截斷。

主題設定框架用了 PHP 8 已移除的函式，**後台會完全無法進入**。兩處修正約 0.5 小時。

▸ 主題與 OptionTree 框架

確定會出錯

2 常見問題外掛

目前版本在 PHP 8.4 上**確定會出錯**。

先嘗試更新到新版；不行就改用其他外掛，並**搬移 54 篇 FAQ**。1–5 小時，是永越最大的變數。

▸ 外掛 Ultimate FAQs

升級前先確認

3 外掛資安事件

Admin Menu Editor Pro 的官方更新伺服器在 9/14 遭入侵。

升級前要先確認**正式站沒有受到影響**（下一頁說明）。

▸ 外掛 Admin Menu Editor Pro

其餘外掛：更新到最新版即可，其中 WPML、WPBakery、Contact Form 7 的版本跨度最大，會多花時間測試。WordPress 核心也要從 6.7.9 更新到最新版。

Admin Menu Editor Pro 資安事件

2026/9/14，官方更新伺服器遭入侵，對外派送了植入後門的 2.35 與 2.36 版。官網目前已暫停販售、下載與更新檢查。

永越網站目前的狀況

環境	狀況
我方測試環境	● 不受影響 安裝的是 2.18 版，也沒有發現入侵跡象
正式站	● 版本待確認 若授權有效又開了自動更新，可能在 9/14 收到惡意版本
若為 2.35 / 2.36	● 應視為已遭入侵 需另外進行資安處理，工時不在本次估算內

我們會檢查的入侵跡象

- wp-content/object-cache/ 底下十六進位名稱的 PHP 檔
- mu-plugins/ 裡 wp- 加十六進位名稱的檔案
- 外掛裡的 includes/wp-user-consent.php
- 以 wp_ocache 開頭的資料庫選項
- wp_ 加十六進位、或 wpsecuresuppbots 的隱藏帳號
- 名為 _wp_cconsent_tick 的排程

▶ 檢查約 1-2 小時，列在準備階段最先進行

兩站都分六個階段，每段上線後網站都正常

STEP 0 準備 西園 2-3 小時 永越 3-6 小時 建立測試環境、全站備份；永越另檢查資安事件、盤點授權	STEP 1 主題修正 西園 12-20 小時 永越 2-3 小時 修正會出錯的程式，實測主題功能，含掛號與預約	STEP 2 外掛更新 西園 2-3 小時 永越 6-10 小時 WordPress 與外掛更新到最新版，並回歸測試	STEP 3 外掛替換與升級 西園 19.5-34 小時 永越 2-8 小時 西園：WPBakery、表單外掛；永越：常見問題外掛	STEP 4 PHP 8.4 測試 西園 6-8 小時 永越 6-8 小時 在 PHP 8.4 環境整站回歸測試，修正問題	STEP 5 正式上線 西園 2-3 小時 永越 2-4 小時 切換到 PHP 8.4，上線後監控
--	--	--	---	---	---



STEP 0-3 都在**現行 PHP 7.4** 上完成並分批上線，每一批上線後網站都正常運作。最後才切到 PHP 8.4：**西園**搬到貴院新主機，舊主機保留到穩定為止；**永越**先在測試環境驗證，再切換正式站。兩站都**備妥隨時切回的退回方案**。

兩站合計 65–110 小時，約 9–14 個工作天

階段	西園醫院	小時	永越健檢	小時
0. 準備	同步正式站到測試環境、全站備份，WordPress 核心升到最新版	2–3	確認正式站版本、檢查資安事件、盤點授權、建立測試環境與備份	3–6
1. 主題修正	修首頁輪播；主題與子主題實測修正（含網路掛號、App 資料介面）；清理棄用警告	12–20	修正 2 個致命問題、清除 PHP 警告，回歸測試並部署	2–3
2. 外掛更新	約 35 套外掛更新到最新版，並確認設定	2–3	WordPress 6.7.9 升到最新版、約 39 套外掛更新；回歸測試 16 種頁面範本、多語與預約表單	6–10
3. 外掛替換與升級	WPBakery 升級與版面修正 16–28；表單收件外掛換新版 3–5；移除舊外掛 0.5–1	19.5–34	常見問題外掛更新或替換 1–5；移除用不到的外掛；修正既有的後台錯誤（選做）；測試	2–8
4. PHP 8.4 測試	部署到新主機（PHP 8.4），整站回歸測試	6–8	測試環境切換 PHP 8.4，自動掃描與人工測試前後台，修正問題	6–8
5. 正式上線	備份、切換到新主機、上線後監控；舊主機保留作為退回方案	2–3	備份、正式站切換 PHP 8.4、冒煙測試，觀察錯誤紀錄 24–48 小時	2–4
小計	約 6–9 個工作天	44–71	約 3–5 個工作天	21–39
兩站合計（約 9–14 個工作天）				65–110

不含：西園主題改版（另估 24–40 小時）與新主機的作業系統、軟體安裝；永越替換久未維護的外掛（每個另加 2–4 小時）；資安事件處理（若已遭入侵）；驗收時間；授權費用。

需付費的外掛，首年 US\$213 起

外掛	價格	何時需要	說明
西園醫院			
WPBakery Page Builder	US\$82 一次性	必要	頁面編輯器，目前沒有有效授權
ACF PRO	US\$49 / 年	建議	自訂欄位，購買才能取得更新
Slider Revolution	US\$45 / 年	選購	目前停用，要繼續使用才需購買
永越健檢			
WPBakery Page Builder	US\$82 一次性	必要	頁面編輯器，目前沒有有效授權
WPML	€99 / 年	授權到期才需續約	多語外掛 CMS 方案；網站用 WPBakery 排版，需此方案
ACF PRO	US\$49 / 年	授權到期才需續約	子主題大量使用自訂欄位，不能拿掉

西園首年

US\$131 含選購 US\$176

永越首年（視授權狀況）

US\$82 – €99 + US\$131

兩站首年合計

US\$213 – €99 + US\$262

含 Slider Revolution 再加 US\$45

2026/10/5 官網公告價，未稅，皆為單一網站授權。永越的 Admin Menu Editor Pro 官網停售中，現有版本可在 PHP 8.4 執行，不需購買；兩個搬站工具建議移除，不需續約。

需要貴院確認的四件事

1 西園：新主機環境

- 請準備一台新的 VM：Ubuntu 24.04 LTS 或 26.04 LTS
- PHP 8.4（含 curl、gd、mbstring、xml、zip、intl、mysqli），MySQL 8.4 或 MariaDB 11.4
- 新主機需能連到院內掛號系統；若有來源 IP 白名單，請加入新主機

2 永越：授權與範圍

- WPML、ACF PRO 的授權是否有效、何時到期、登記在誰名下
- 常見問題外掛（Ultimate FAQs）是否有使用付費功能
- 是否一併替換久未維護的外掛（如 Timeline Express，每個另加 2–4 小時）

3 測試協助

- 西園網路掛號與永越預約表單都會串接院內系統，請協助安排測試方式或時段，避免產生真實掛號
- 請使用表單匯出的同仁，確認新版匯出檔案符合需求

4 時程安排

- 依貴院可配合的時間，排定新主機交付與測試窗口；兩站可同時進行或錯開
- 確認兩站正式上線的日期，建議在夜間等離峰時段，以及需要事先通知的單位

① 確認範圍、授權與新主機 → ② STEP 0–3 修正並分批上線 → ③ PHP 8.4 整站測試 → ④ 正式切換並觀察
